

HISTORIAL DEL EQUIPO

Verificar el historial del equipo relacionado con:

N	DESCRIPCION	CONDICION			OBSERVACIONES
		OK	R	N/A	
1	Certificado de Origen	X			
2	Record de Inspecciones			X	EL EQUIPO ES INSPECCIONADO POR PRIMERA VEZ.
3	Placa de Ident. (marca; modelo; serial; capacidad)	X			
4	Existencia del Programa de Mantenimiento		X		
5	Libro de Reparaciones y Reemplazos			X	
6	Record de las Pruebas de Carga			X	EL EQUIPO ES INSPECCIONADO POR PRIMERA VEZ.

DISPOSITIVO DE IZAMIENTO

N	DESCRIPCION	CONDICION			OBSERVACIONES
		OK	R	N/A	
7	Cuerpo / Estructura	X			
8	Estado de la Pintura	X			
9	Soldaduras en General	X			
10	Ojal o Cancamos	X			
11	Torcedura 0°			X	
12	Desgaste ≤ 10%			X	
13	Resultados NDT	X			

ESTRUCTURA

N	DESCRIPCION	CONDICION			OBSERVACIONES
		OK	R	N/A	
14	Cuerpo / Estructura	X			
15	Estado de la Pintura	X			
16	Soldaduras en General	X			
17	Resultados NDT	X			
18	Barandas	X			
19	Pasadores			X	
20	Ojales			X	
21	Cupillas de Seguridad			X	
22	Compuerta	X			
22.1	Refuerzos	X			
22.2	Gratingo o Malla	X			
23	Piso	X			
23.1	Refuerzos	X			
23.2	Gratingo o Malla	X			

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

N	DESCRIPCION	CONDICION			OBSERVACIONES
		OK	R	N/A	
24	Sistema de Eslingamiento de Personal			X	
25	Cabo de Vida			X	
26	Pasa Mano	X			
27	Cerrojo de Compuerta	X			
28	Rodapie	X			

RESUMEN FOTOGRAFICO DE LA INSPECCION



VISTA LATERAL



VISTA LATERAL



PRUEBA DE CARGA

INSPECCION CON LIQUIDOS PENETRANTES

EMPRESA:	MAQUISUR 304, COMPAÑIA ANONIMA	FABRICANTE:	ISI
EQUIPO:	CESTA DE ELEVACION DE PERSONAL	MODELO:	CA 02
UBICACIÓN	PUERTO ORDAZ ESTADO BOLIVAR	SERIAL	ISI CI 02

INFORMACION TECNICA.

METODO DE INSPECCION	LIQUIDOS PENETRANTES	EQUIPOS UTILIZADOS			
PROCEDIMIENTO DE INSPECCION	ASTS-NDT-P-01	LIMPIADOR	SKC-S	TIEMPO:	N/A.
TIPO DE ENSAYO	REMOVIBLE CON SOLVENTE	PENETRANTE:	SKL-SP	TIEMPO:	5 MIN.
COLOR	ROJO	MEDIO	LIQUIDO	REVELADOR	SKD-S2
				TIEMPO:	10 MIN.

ESTÁNDAR DE ACEPTACION: ASME SEC. V ART. 6

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES


RESUMEN DE LA INSPECCION.

SE REALIZO INSPECCION VISUAL Y APLICACIÓN DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (LIQUIDOS PENETRANTES) EN LOS PUNTOS CRITICOS Y NODOS DE SOLDADURA PRINCIPAL DE LA ESTRUCTURA DE IZAJE SIN DETECTAR DISCONTINUIDADES RELEVANTES.

RECOMENDACIONES.

APLICAR PINTURA PARA EVITAR FOCOS DE CORROSIÓN.

RESUMEN FOTOGRAFICO.

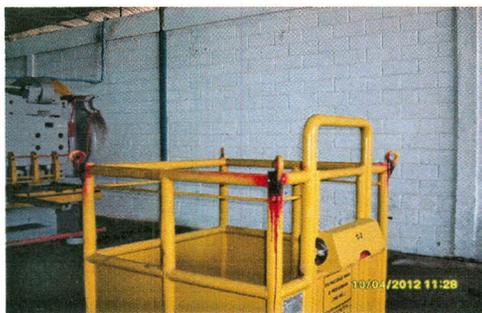

DURANTE LA INSPECCIÓN



FINAL DE LA INSPECCIÓN

CONDICION FINAL

RESULTADOS SATISFACTORIOS

	REALIZADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
NOMBRE:	JOSE LUIS ANDASOL	FRANCISCO AINAGAS	BRENDA FREITAS
N° INSP:	ASTS-004	ASTS-001	ASTS-002
FIRMA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
NIVEL:	NIVEL II	NIVEL II	
